




# COMUNE DI FILETTINO

PROVINCIA DI FROSINONE

## PROGETTO ESECUTIVO

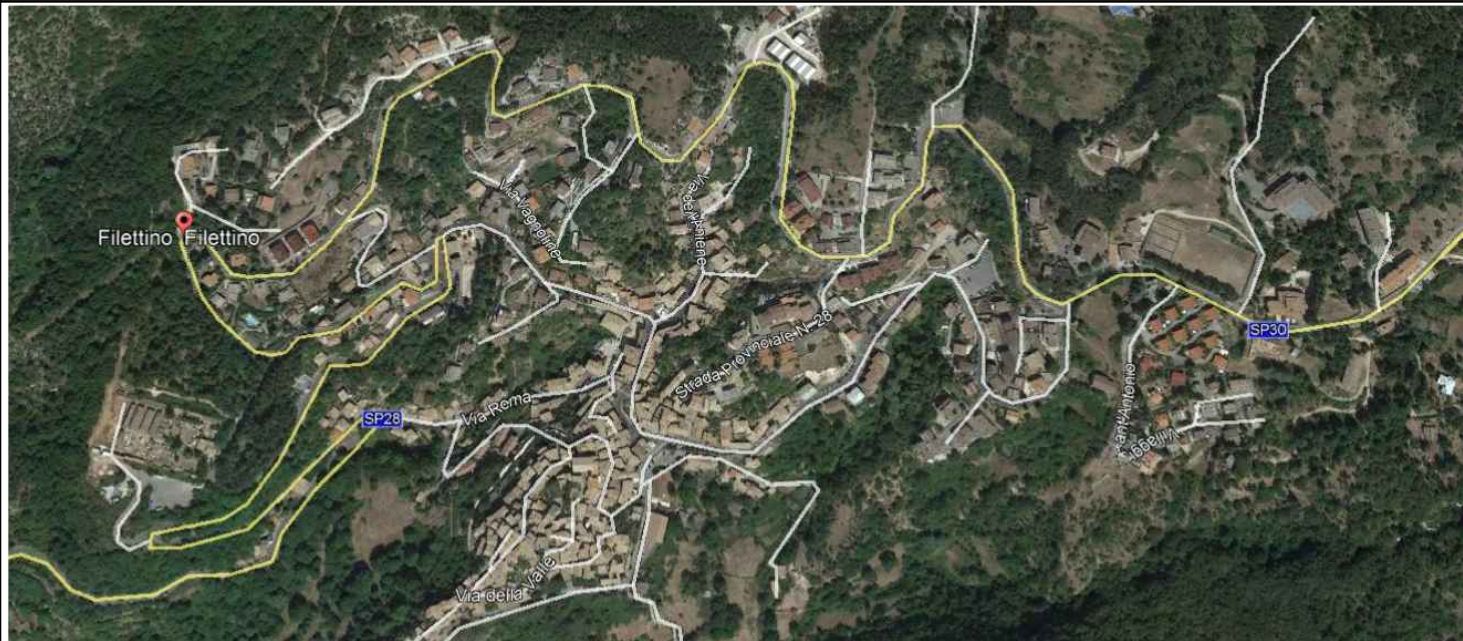

# RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE

Committente:

**COMUNE DI FILETTINO (FR)**

Largo Martin Filetico,21 – 03010 FILETTINO (FR)

PROGETTISTA:

**Arch. Sandro TUFI**

Via Prenestina n° 237–Serrone (FR)–03010  
Part. I.V.A. 02121680603 C.F.: TFUSDR66D12G659C  
Tel.Fax 0775/595556 Cell. 3397035809  
Email: tufi.sandro@gmail.com

Tavola

**PSC 02**

Scala

DATA

20/03/2019

FILE

–

ALLEGATO

**DIAGRAMMA DI GANTT  
(Cronoprogramma dei lavori)**

AGGIORNAMENTI

## PREMESSA CRONOPROGRAMMA LAVORI

Il programma dei lavori predisposto nel presente PSC è basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di progetto. Il programma dei lavori è sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell'opera.

**È compito dell'appaltatore confermare quanto esposto o notificare immediatamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali proposte di modifiche o diversità rispetto a quanto programmato.**

**Le eventuali modifiche proposte dall'appaltatore, potranno essere accettate dal CSE, se compatibili con i tempi di esecuzione lavori previsti dal contratto tra Committente e Appaltatore e dall'analisi delle interferenze.**

**Queste ultime in ogni caso non dovranno compromettere e/o peggiorare le condizioni di lavoro.**

Tutte le modifiche proposte devono indicare pari condizioni di sicurezza per i lavoratori occupati. Le eventuali modifiche al programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante. Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

L'appaltatore che ha l'obbligo di predisporre il POS (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà in accordo con il CSE e il DL aggiornare il programma che segue in relazione alle scelte operative ed organizzative che restano autonome dell'appaltatore.

Costo medio operaio (specializzato/ qualificato, riferimento costo desunto dal CCLN settore edile compreso % oneri e utili imp.) :	Operaio specializ.	€	29,46
	Operaio qualificato	€	27,45
	Costo medio	€	28,46

Costo unitario giornaliero manodopera:	€ 28,46	X	8 ore =	€ 227,64
--	---------	---	---------	----------

Importo complessivo dei lavori:	€	<b>789 535,13</b>
---------------------------------	---	-------------------

Costo complessivo mano d'opera	€ 789 535,13	X	<b>43,00%</b>	=	€ 339 500,11
--------------------------------	--------------	---	---------------	---	--------------

Totale uomini/giorno complessivi:	€ 339 500,11	:	€ 227,64	=	<b>1 491 u/g</b>
-----------------------------------	--------------	---	----------	---	------------------

Presenza Media in cantiere prevista:	(2 squadre da 4 uomini su due tratti di strade diversi)	<b>8</b>	<b>u</b>
--------------------------------------	--	----------	----------

Giorni lavorativi previsti		186	giorni
----------------------------	--	-----	--------

<b>Settimane lavorative (5gg a settimana)</b>		<b>37</b>	<b>sett.</b>
---	--	-----------	--------------

Mesi lavorativi (20 gg a mese)		9	mesi
--------------------------------	--	---	------

<b>Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori</b>		<b>261</b>	<b>giorni</b>
---	--	------------	---------------

NOME ATTIVITA'	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8											
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	5 gg																																																													
Recinzione e della segnaletica di cantiere																																																														
Installazione baraccamenti e servizi igienici																																																														
<b>1 - VIA DEL GOTTARDO E VIC. DELLA VALLE</b>	20 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>2 - PIAZZA IX MARZO - VIA DEL FORNO</b>	25 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>3 - VIA DELLA FREDDA</b>	25 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>4 - VIA DEL CANCELLO</b>	15 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>5 - VIA DEL MERCATO- VIA DELLA CHIESA</b>	30 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>6 - VIA F. ARQUATI</b>	25 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>7 - VIA DELLA VARIOLA</b>	40 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>8 - VIA I° MAGGIO - LARGO M. FILETICO</b>	20 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>9 - VIA DELLA VALLE</b>	20 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>10 - VICOLO ALTA CORTE</b>	15 gg																																																													
Pavimentazioni, cigli e sottofondi																																																														
Reti Idrica																																																														
Rete Acque Meteoriche																																																														
Rete Fognaria																																																														
<b>11 - VIA DEL FORNO E PIAZZA DELLA CORTE</b>	35 gg																																																													







