

SICUREZZA

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
 La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
 NON PASSARE SOTTO PONTEGGI E CARICHI SOSPESI
 NON SALIRE O SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
 ATTENZIONE CADUTA MATERIALI
 E' OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA

E' OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI PROTETTIVI
 E' OBBLIGATORIO IL CASCO PROTETTIVO
 SCARPE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Tipologia: A. PREPARAZIONE AREA DI LAVORO

Descrizione: II. BONIFICA TERRENO ESECUZIONE RECINZIONE; ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE

Modalità di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnaletico e stabilire un percorso di massima per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 81/08 e smi. Identificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti e preparare il terreno provvedendo ad una bonifica del terreno e ad eliminare il ristagno delle acque meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenze ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere.

Interconnessioni con altri lavori : In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni

Attrezzature e macchinari: Mazza, piccole, pala **Materiali:** Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete

Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduta del materiale con conseguente schiacciamento

Misure provvisoriai : Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee andatoie con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomini ed a m.1.20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione.


Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza

Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

NB. PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO OGGETTO DEI LAVORI, SARA' OBBLIGO DEL CSE PROVVEDERE AD INDIRE APPOSITA RIUNIONE DI COORDINAMENTO, ALLA PRESENZA DELLA COMMITTENZA, AL FINE DI PROGRAMMARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DI CANTIERE COMPATIBILMENTE CON LE ATTIVITA' IPZS, ED INDIVIDUARE I PERCORSI IDONEI AL FINE DI EVITARE INTERFERENZE CON LO STESSO PERSONALE IPZS.

LEGENDA

- RECINZIONE h=2,00m
- INGRESSO AUTOMEZZI
- INGRESSO PEDONALE
- BARACCAMENTI
- AREA DI STOCCAGGIO
- AREA DEPOSITO ATTREZZATURE
- AREA DEPOSITO MACCHINARI
- AREA STAZIONAMENTO POMPA E BOTTE CLS
- CARTELLI DI CANTIERE
- PONTEGGIO METALLICO
- DISPERSORE DI TERRA
- QUADRO ELETTRICO
- AREA DI CANTIERE

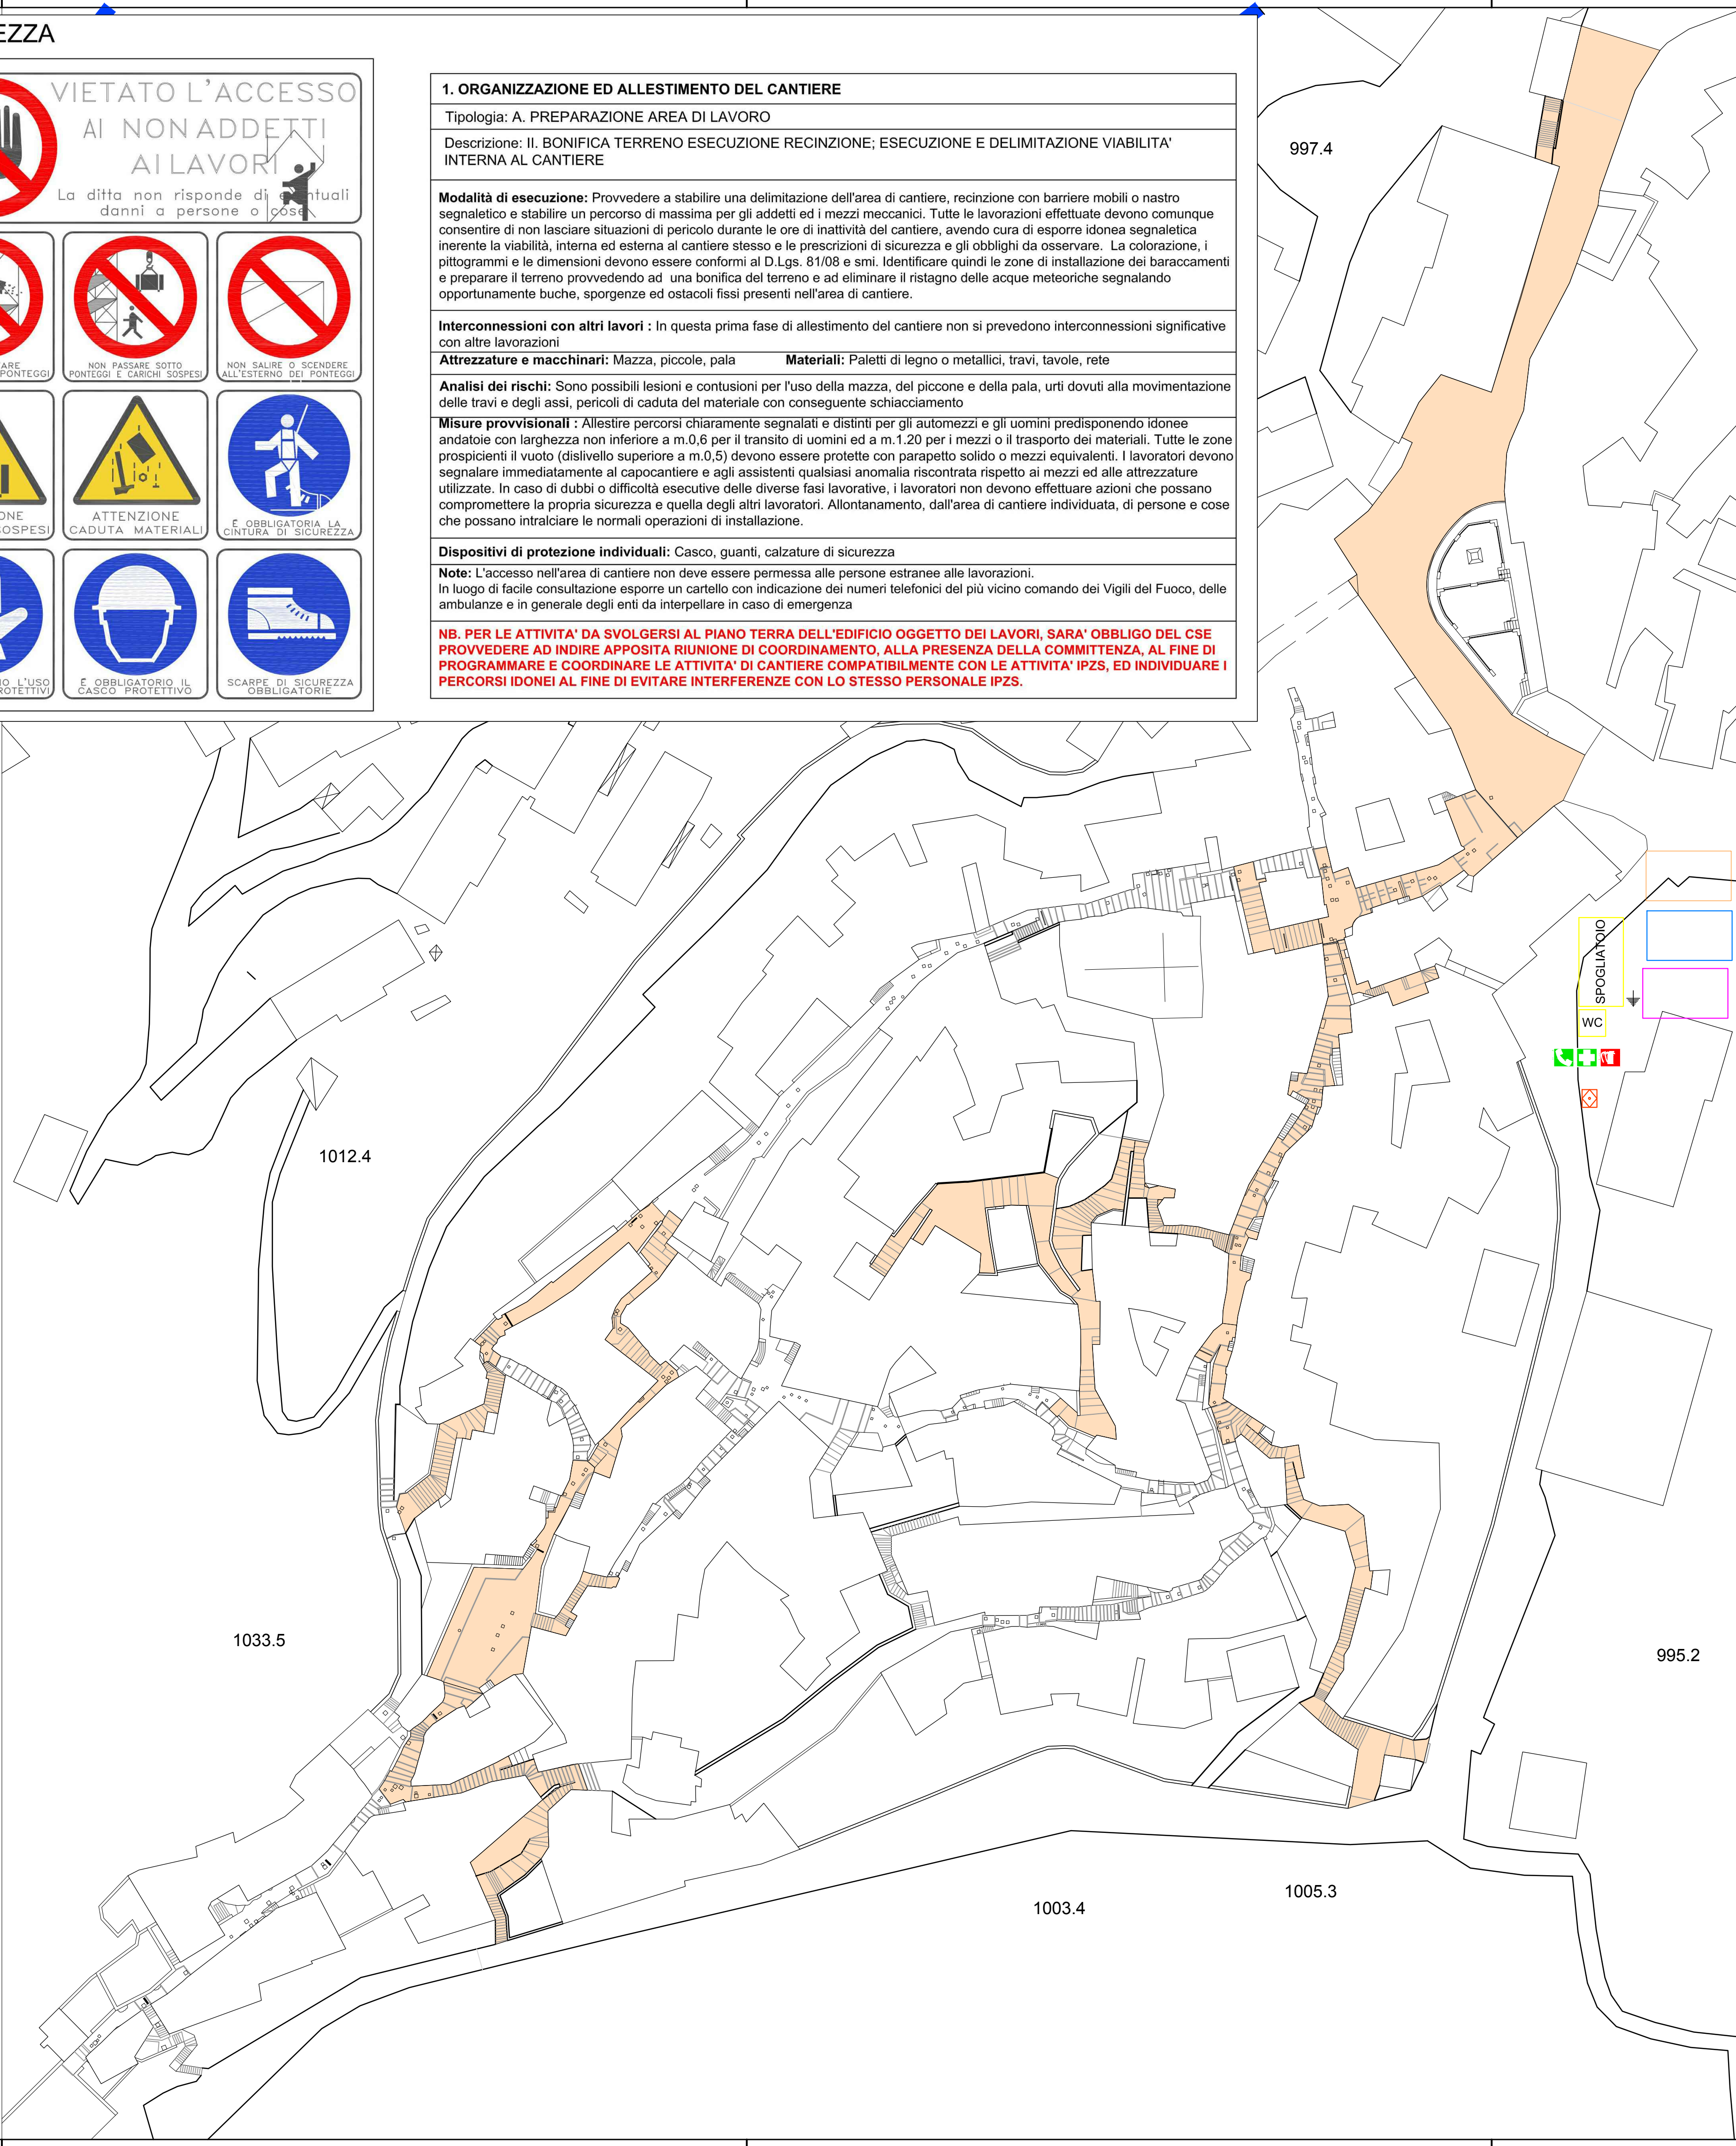

COMUNE DI FILETTINO

PROVINCIA DI FROSINONE

PROGETTO ESECUTIVO



RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE

Committente: **COMUNE DI FILETTINO (FR)**
 Largo Martin Filetico,21 - 03010 FILETTINO (FR)

PROGETTISTA: Arch. Sandro TUFI Via Prenestina n° 237-Serrone (FR)-03010 Part. I.V.A. 02121680603 C.F.: TFUSD660126659C Tel.Fax 0775/595556 Cell. 3397035809 Email: tufi.sandro@gmail.com	Tavola PSC 05	Scala 1:500
	DATA 20/03/2019	FILE -
ALLEGATO LAYOUT DI CANTIERE		
CENTRO STORICO		
AGGIORNAMENTI		
